

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5946 / 2021 Ordinário Data: 28/07/2021 Página 1 / 1

Credor: 102556 DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL
Endereço: Comercial: AV. CASTELO BRANCO, 179 - - C.E.P. 87111760 - Sarandi - PR
C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66 Insc. Est.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 36779-6

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 192
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 99 OUTRAS EDIFICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 28/2021

Nº NAD.....: 5842

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

100.000,00

Valor

52.767,27

Saldo Atual

47.232,73

HISTÓRICO: Construção de muro em bloco de concreto estrutural para atender a demanda do Cemitério Municipal, medindo 200,00m², em condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas na planilha de orçamento, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, MEDINDO 200,00 M².	52.767,27	52.767,27

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 52.767,27

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL
C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

19/08/2021



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

1º Termo Aditivo do Contrato nº. 182/2021

Pelo presente instrumento, o **Município de Marialva**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.282.680/0001-45, com sede na Rua Santa Efigênia nº 680, em Marialva-Pr, denominado Contratante, e de outro lado a empresa **DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Marialva, Estado do Paraná, situado à Avenida Castelo Branco nº 179, Jardim Vera Cruz, CEP 87.111.760, Telefone (44) 3288-1127, E-mail metalurgicapaulista@hotmail.com, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.306.197/0001-66, denominada Contratada, têm entre si justo e acertado, **na forma do art. 65, inciso I, "b", § 1º da Lei de Licitações**, as seguintes alterações a serem empreendidas no **Contrato supracitado**, firmados entre as partes no dia 02 de junho de 2021, decorrente da Dispensa de Licitação nº. 28/2021 e que tem por objeto a construção de muro em bloco de concreto estrutural para atender a demanda do Cemitério Municipal, medindo 200,00m², em condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas na planilha de orçamento, Projeto Básico e seus demais anexos integrantes, localizado Rua Wenceslau Bras, Lote: 82-A, Gleba Patrimônio Marialva com recursos próprios do Município:

Cláusula Primeira _ Por força deste acordo, altera-se a quantidade e qualidade dos materiais a serem executados para se reduzir o percentual de 1,02% (um inteiro e dois centésimos por cento), conforme pareceres técnicos e jurídico e planilhas em anexo ao processo.

Cláusula Segunda _ Esta alteração acarretará uma redução metafísica de R\$-543,23 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos) no valor total do contrato firmado.

Cláusula Terceira _ Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

Assim, por estarem justos e acertados, firmam o presente acordo em 02 (duas) vias, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surtam os devidos efeitos legais.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva – Pr, em 08 de julho de 2021.

Município de Marialva
Victor Celso Martini
Contratante

DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUCAO
CIVIL:09306197000166
Diogenes Alves de Souza Construção Civil
Contratada

Testemunhas:

Nome: Cláudio Virgentin
CPF : 160.477.619-68

Nome: Marina M. M. Matuguma
CPF : 039.897.088-21

cto = 182/2021
R\$ 533.10,50 - 543,23 = 52767,27
DISP = 28/21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000768 - E
Autenticidade
QE2G-KQ63
Data de Emissão
12/08/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUCAO CIVIL
CPF/CNPJ: 09.306.197/0001-66 IM: 626326 IE: Fone: ,179,JD.VERA CRUZ (GL.RIB.AQUIDABAN/SARANDI) -
Endereço: CASTELO BRANCO
Município: Sarandi UF: PR E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 IM: IE: Fone: 000000000000
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA,680,CENTRO - CEP : 86990000
Município: MARIALVA UF: PR E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, MEDINDO 200,00 M².

Empenho: 5946/2021

Nº Licitação: 28/2021

Nº Processo: 23/2021

Nº Contrato: 182/2021


Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

medição 01: solicitada 11/08/2021. 100% finalizada ART de Obra ou Serviço: 1720212050134

Instrução Normativa 971/2009

material aplicado 65%: 34.298,72

mão de obra aplicada 35%: 18.468,55 retenção 11% sobre o valor de mão de obra

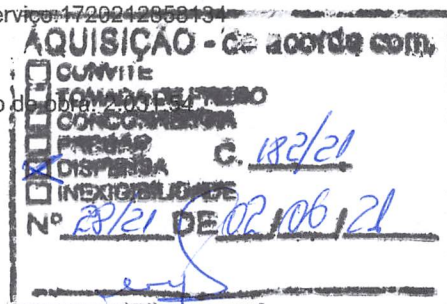

Processo executado por: 168.205.23.144

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
2.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	52.767,27	3,0000%	1.583,02	52.767,27

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 49.152,71

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



bruno.

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

CONTRATO Nº 182/2021-PMM - PMM

LOCAL: MARIALVA

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ÁREA: 200,00 m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO 01			MED ACUMUL			
					QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	SALDO(R\$)
canteiro				R\$ 2.364,44				R\$ 2.364,44			R\$ 2.364,44			
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA)	m²	3,00	364,00	R\$ 1.092,00	3,00	100,00%	1.092,00	3,00	100,00%	1.092,00	3,00	100,00%	1.092,00	
CONTAINER DE OBRA 4,5 M²	mes	2,00	339,95	R\$ 679,90	2,00	100,00%	679,90	2,00	100,00%	679,90	2,00	100,00%	679,90	
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES	m²	120,00	0,38	R\$ 45,24	120,00	100,00%	45,24	120,00	100,00%	45,24	120,00	100,00%	45,24	
LOCAÇÃO CONVENCIONAL	m	100,00	5,47	R\$ 547,30	100,00	100,00%	547,30	100,00	100,00%	547,30	100,00	100,00%	547,30	
fundacao				R\$ 18.809,61				R\$ 18.809,61			R\$ 18.809,61			
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTENCIA C25, ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 10,00MM	m	122,10	56,03	R\$ 6.841,26	122,10	100,00%	6.841,26	122,10	100,00%	6.841,26	122,10	100,00%	6.841,26	
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA BALDRAME EM AÇO CA-50 DE 8 MM (BALDRAME)	kg	158,00	16,26	R\$ 2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 5,0 MM	kg	121,92	19,77	R\$ 2.410,28	121,92	100,00%	2.410,28	121,92	100,00%	2.410,28	121,92	100,00%	2.410,28	
CONCRETO FCK=25 MPA - BALDRAME	m³	6,60	436,98	R\$ 2.884,08	6,60	100,00%	2.884,08	6,60	100,00%	2.884,08	6,60	100,00%	2.884,08	
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 3)	m³	1,10	102,74	R\$ 113,01	1,10	100,00%	113,01	1,10	100,00%	113,01	1,10	100,00%	113,01	
FORMA DE MADEIRA P/ BALDRAME	m²	66,00	60,48	R\$ 3.991,42	66,00	100,00%	3.991,42	66,00	100,00%	3.991,42	66,00	100,00%	3.991,42	
super estrutura				R\$ 31.593,22				R\$ 31.593,22			R\$ 31.593,22			
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	kg	159,80	14,23	R\$ 2.274,00	159,80	100,00%	2.274,00	159,80	100,00%	2.274,00	159,80	100,00%	2.274,00	
ARMADURA TRANSVERSAL PILAR CA-50 DE 5,0 MM (PILAR)	kg	53,85	19,77	R\$ 1.064,54	53,85	100,00%	1.064,54	53,85	100,00%	1.064,54	53,85	100,00%	1.064,54	
CONCRETO FCK=25 MPA - PILAR	m³	2,85	436,98	R\$ 1.244,96	2,85	100,00%	1.244,96	2,85	100,00%	1.244,96	2,85	100,00%	1.244,96	
FORMA MADEIRA P/ PILAR	m²	48,84	60,48	R\$ 2.953,65	48,84	100,00%	2.953,65	48,84	100,00%	2.953,65	48,84	100,00%	2.953,65	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39CM SEM VÃOS E ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	200,00	81,03	R\$ 16.205,80	200,00	100,00%	16.205,80	200,00	100,00%	16.205,80	200,00	100,00%	16.205,80	
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA DE RESPALDO EM AÇO CA-50 DE 8 MM (RESPALDO)	kg	158,00	16,26	R\$ 2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 5 MM	kg	89,83	19,77	R\$ 1.776,01	89,83	100,00%	1.776,01	89,83	100,00%	1.776,01	89,83	100,00%	1.776,01	
CONCRETO FCK=25 MPA - VIGA RESPALDO	m³	3,85	436,98	R\$ 1.682,38	3,85	100,00%	1.682,38	3,85	100,00%	1.682,38	3,85	100,00%	1.682,38	
CANALETE DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM FCK 14 MPA COM INSTALAÇÃO	unid	282,00	6,46	R\$ 1.822,33	282,00	100,00%	1.822,33	282,00	100,00%	1.822,33	282,00	100,00%	1.822,33	
TOTAL				R\$ 52.767,27				R\$ 52.767,27			R\$ 52.767,27			

CUSTO TOTAL EM R\$ 52.767,27

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$ 52.767,27

% DA MEDIÇÃO 100,00%

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 52.767,27

% DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 100,00%

DATA DA MEDIÇÃO: 12/08/2021

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29.230





1. Responsável Técnico

FELIPE VIVEROS

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL

RNP: 1715114779

Carteira: PR-151675/D

Registro/Visto: 59540

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

CENTRO - MARIALVA/PR 86990-000

Contrato: 182/2021

Celebrado em: 11/06/2021

Valor: R\$ 53.310,50

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VENCESLAU BRAZ, 2-176

CENTRO - MARIALVA/PR 86990-000

Data de Início: 15/06/2021

Previsão de término: 15/08/2021

Coordenadas Geográficas: -23,487534 x -51,783683

4. Atividade Técnica

Assessoria

Quantidade

Unidade

[Assessoria, Consultoria, Execução de obra] de muro

200,00

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

muro de blocos de concreto 200 m²

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Profissional

Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARIALVA

15

JUNHO

de 2021

Local

data

FELIPE VIVEROS:05695124921

Assinado de forma digital por FELIPE

VIVEROS:05695124921

Dados: 2021.08.10 08:24:04 -03'00'

FELIPE VIVEROS - CPF: 056.951.249-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CNPJ: 76.282.680/0001-45

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 14/06/2021

Valor Pago: R\$ 233,94

Nosso número: 2410101720212858134



SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE MARIALVA											
EMPRESA: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL					CNPJ:09.306.197/0001-66						
CONTRATO:			182/2021		ART Nº :1720212858134						
EMPENHO:			5946/2021								
MURO DO CEMITÉRIO											
SINAPI 12/2020 - BDI: 30%			LOTE	82-A	GLEBA DO PATRIMÔNIO MARIALVA						
			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO			DATA	11/08/2021		
DESCRIÇÃO DO ITEM			UNIDADE	%	VALOR TOTAL	JÁ MEDIDO	ATUAL	VALOR TOTAL	PROGRAMAÇÃO:		
CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES			MEDIÇÃO 01			ACUMULADO		QUANT.	R\$ +BDI	TOTAL	
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA			M2	100%	R\$ 1.092,00	0%	100%	R\$ 1.092,00	3,00	R\$ 364,00	R\$ 1.092,00
CONTAINER DE OBRA 4,5 M²			MÊS	100%	R\$ 679,90	0%	100%	R\$ 679,90	2,00	R\$ 339,95	R\$ 679,90
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES			M2	100%	R\$ 45,24	0%	100%	R\$ 45,24	120,00	R\$ 0,38	R\$ 45,24
LOCAÇÃO CONVENCIONAL			M	100%	R\$ 547,30	0%	100%	R\$ 547,30	100,00	R\$ 5,47	R\$ 547,30
FUNDAÇÕES					R\$ 2.364,44			R\$ 2.364,44	VALOR:		R\$ 2.364,44
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTÊNCIA C25, ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 10 MM (ESTACA)			M	100%	R\$ 6.841,26	0%	100%	R\$ 6.841,26	122,10	R\$ 56,03	R\$ 6.841,26
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA BALDRAME EM AÇO CA-50 DE 8 MM (BALDRAME)			KG	100%	R\$ 2.569,55	0%	100%	R\$ 2.569,55	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55
ARMADURA TRANVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 5 MM (ESTACA/BALDRAME)			KG	100%	R\$ 2.410,29	0%	100%	R\$ 2.410,29	121,92	R\$ 19,77	R\$ 2.410,29
CONCRETO FCK = 25MPA - BALDRAME			M3	100%	R\$ 2.884,08	0%	100%	R\$ 2.884,08	6,60	R\$ 436,98	R\$ 2.884,08
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3)			M3	100%	R\$ 113,01	0%	100%	R\$ 113,01	1,10	R\$ 102,74	R\$ 113,01
FORMA EM MADEIRA P/ BALDRAME			M2	100%	R\$ 3.991,42	0%	100%	R\$ 3.991,42	66,00	R\$ 60,48	R\$ 3.991,42
SUPER ESTRUTURA					R\$ 18.809,61			R\$ 18.809,61	TOTAL:		R\$ 18.809,61
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR EM AÇO CA-50 DE 10MM (PILAR)			KG	100%	R\$ 2.274,00	0%	100%	R\$ 2.274,00	159,80	R\$ 14,23	R\$ 2.274,00
ARMADURA TRANVERSAL PILAR CA-50 DE 5 MM (PILAR)			KG	100%	R\$ 1.064,54	0%	100%	R\$ 1.064,54	53,85	R\$ 19,77	R\$ 1.064,54
CONCRETO FCK = 25MPA - PILAR			M3	100%	R\$ 1.244,96	0%	100%	R\$ 1.244,96	2,85	R\$ 436,98	R\$ 1.244,96
FORMA EM MADEIRA P/ PILAR			M2	100%	R\$ 2.953,65	0%	100%	R\$ 2.953,65	48,84	R\$ 60,48	R\$ 2.953,65
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.			M2	100%	R\$ 16.205,80	0%	100%	R\$ 16.205,80	200,00	R\$ 81,03	R\$ 16.205,80
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA DE RESPALDO EM AÇO CA-50 DE 8 MM (RESPALDO)			KG	100%	R\$ 2.569,55	0%	100%	R\$ 2.569,55	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55
ARMADURA TRANVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 5 MM (RESPALDO)			KG	100%	R\$ 1.776,01	0%	100%	R\$ 1.776,01	89,83	R\$ 19,77	R\$ 1.776,01
CONCRETO FCK = 25MPA - VIGA DE RESPALDO			M3	100%	R\$ 1.682,38	0%	100%	R\$ 1.682,38	3,85	R\$ 436,98	R\$ 1.682,38

CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA COM INSTALAÇÃO	UN	100%	R\$ 1.822,33	0%	100%	R\$ 1.822,33	282,00	R\$ 6,46	R\$ 1.822,33
			R\$ 31.593,22			R\$ 31.593,22			R\$ 31.593,22
TOTAL FINAL			R\$ 52.767,27			R\$ 52.767,27			R\$ 52.767,27
VALOR POR M²						R\$ 263,84			R\$ 263,84

**DIOGENES ALVES DE
SOUZA CONSTRUCAO
CIVIL:09306197000166**

Diogenes Alves de Souza construção civil.
CNPJ: 09.306.197/0001-66

**FELIPE
VIVEROS:
0569512492
1**

Digitally signed by FELIPE
VIVEROS:0569512492 1
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELIPE
VIVEROS:0569512492 1
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2021.08.12 08:35:50-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0

resp. tecnico: FELIPE VIVEROS
Engº Civil – CREA PR: PR-151675/D



1. Responsável Técnico

FELIPE VIVEROS

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL**

RNP: **1715114779**

Carteira: **PR-151675/D**

Registro/Visto: **59540**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ: **76.282.680/0001-45**

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

CENTRO - MARIALVA/PR 86990-000

Contrato: **182/2021**

Celebrado em: **11/06/2021**

Valor: **R\$ 53.310,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VENCESLAU BRAZ, 2-176

CENTRO - MARIALVA/PR 86990-000

Data de Início: **15/06/2021**

Previsão de término: **15/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **-23,487534 x -51,783683**

4. Atividade Técnica

Assessoria

Quantidade

Unidade

[Assessoria, Consultoria, Execução de obra] *de muro*

200,00

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

muro de blocos de concreto 200 m²

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Profissional

Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARIALVA, 15 de **JUNHO** de 2021

Local

data

FELIPE VIVEROS:05695124921

Assinado de forma digital por FELIPE

VIVEROS:05695124921

Dados: 2021.08.10 08:24:04 -03'00'

FELIPE VIVEROS - CPF: 056.951.249-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CNPJ: 76.282.680/0001-45

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em : **14/06/2021**

Valor Pago: **R\$ 233,94**

Nosso número: **2410101720212858134**



SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE MARIALVA									
EMPRESA: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL					CNPJ:09.306.197/0001-66				
CONTRATO:		182/2021		ART Nº :1720212858134					
EMPENHO:		5946/2021							
MURO DO CEMITÉRIO									
SINAPI 12/2020 - BDI: 30%		LOTE	82-A	GLEBA DO PATRIMÔNIO MARIALVA					
MEDIÇÃO 01				ACUMULADO		DATA		11/08/2021	
DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	%	VALOR TOTAL	JÁ MEDIDO	ATUAL	VALOR TOTAL	PROGRAMAÇÃO:		
CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		QUANT.	R\$ +BDI	TOTAL
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	100%	R\$ 1.092,00	0%	100%	R\$ 1.092,00	3,00	R\$ 364,00	R\$ 1.092,00
CONTAINER DE OBRA 4,5 M²	MÊS	100%	R\$ 679,90	0%	100%	R\$ 679,90	2,00	R\$ 339,95	R\$ 679,90
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	M2	100%	R\$ 45,24	0%	100%	R\$ 45,24	120,00	R\$ 0,38	R\$ 45,24
LOCAÇÃO CONVENCIONAL	M	100%	R\$ 547,30	0%	100%	R\$ 547,30	100,00	R\$ 5,47	R\$ 547,30
FUNDAÇÕES			R\$ 2.364,44			R\$ 2.364,44	VALOR:		R\$ 2.364,44
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTÊNCIA C25, ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 10 MM (ESTACA)	M	100%	R\$ 6.841,26	0%	100%	R\$ 6.841,26	122,10	R\$ 56,03	R\$ 6.841,26
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA BALDRAME EM AÇO CA-50 DE 8 MM (BALDRAME)	KG	100%	R\$ 2.569,55	0%	100%	R\$ 2.569,55	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55
ARMADURA TRANVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 5 MM (ESTACA/BALDRAME)	KG	100%	R\$ 2.410,29	0%	100%	R\$ 2.410,29	121,92	R\$ 19,77	R\$ 2.410,29
CONCRETO FCK = 25MPa - BALDRAME	M3	100%	R\$ 2.884,08	0%	100%	R\$ 2.884,08	6,60	R\$ 436,98	R\$ 2.884,08
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3)	M3	100%	R\$ 113,01	0%	100%	R\$ 113,01	1,10	R\$ 102,74	R\$ 113,01
FORMA EM MADEIRA P/ BALDRAME	M2	100%	R\$ 3.991,42	0%	100%	R\$ 3.991,42	66,00	R\$ 60,48	R\$ 3.991,42
SUPER ESTRUTURA			R\$ 18.809,61			R\$ 18.809,61	TOTAL:		R\$ 18.809,61
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR EM AÇO CA-50 DE 10MM (PILAR)	KG	100%	R\$ 2.274,00	0%	100%	R\$ 2.274,00	159,80	R\$ 14,23	R\$ 2.274,00
ARMADURA TRANVERSAL PILAR CA-50 DE 5 MM (PILAR)	KG	100%	R\$ 1.064,54	0%	100%	R\$ 1.064,54	53,85	R\$ 19,77	R\$ 1.064,54
CONCRETO FCK = 25MPa - PILAR	M3	100%	R\$ 1.244,96	0%	100%	R\$ 1.244,96	2,85	R\$ 436,98	R\$ 1.244,96
FORMA EM MADEIRA P/ PILAR	M2	100%	R\$ 2.953,65	0%	100%	R\$ 2.953,65	48,84	R\$ 60,48	R\$ 2.953,65
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	100%	R\$ 16.205,80	0%	100%	R\$ 16.205,80	200,00	R\$ 81,03	R\$ 16.205,80
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA DE RESPALDO EM AÇO CA-50 DE 8 MM (RESPALDO)	KG	100%	R\$ 2.569,55	0%	100%	R\$ 2.569,55	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55
ARMADURA TRANVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 5 MM (RESPALDO)	KG	100%	R\$ 1.776,01	0%	100%	R\$ 1.776,01	89,83	R\$ 19,77	R\$ 1.776,01
CONCRETO FCK = 25MPa - VIGA DE RESPALDO	M3	100%	R\$ 1.682,38	0%	100%	R\$ 1.682,38	3,85	R\$ 436,98	R\$ 1.682,38

CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA COM INSTALAÇÃO	UN	100%	R\$ 1.822,33	0%	100%	R\$ 1.822,33	282,00	R\$ 6,46	R\$ 1.822,33
			R\$ 31.593,22			R\$ 31.593,22			R\$ 31.593,22
TOTAL FINAL			R\$ 52.767,27			R\$ 52.767,27			R\$ 52.767,27
VALOR POR M²						R\$ 263,84			R\$ 263,84



Diogenes Alves de Souza construção civil.
CNPJ: 09.306.197/0001-66

09.306.197/0001-66
DIOGENES ALVES DE SOUZA
CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP
AV. CASTELO BRANCO, 179-A - JD. VERA CRUZ
CEP 87111-760 - SARANDI - PR

**FELIPE
VIVEROS:
0569512492
1**

Digitally signed by FELIPE
VIVEROS:05695124921
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCO-REIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=FELIPE
VIVEROS:05695124921
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2021.08.12 08:35:50-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0

resp. tecnico: FELIPE VIVEROS
Engº Civil – CREA PR: PR-151675/D



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO MURO CEMITÉRIO

Constrato 182/2021 - PMM

sinapi 12/2021 bdi:30%

		licitado				reprogramado		
canteiro					R\$ 2.364,44			R\$ 2.364,44
desc	unid	quant	R\$ unit	R\$ +bdi	total	quant	R\$ +bdi	total
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA)	m²	3	R\$ 280,00	R\$ 364,00	R\$ 1.092,00	3,00	R\$ 364,00	R\$ 1.092,00
CONTAINER DE OBRA 4,5 M²	mes	2	R\$ 261,50	R\$ 339,95	R\$ 679,90	2,00	R\$ 339,95	R\$ 679,90
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES	m²	120	R\$ 0,29	R\$ 0,38	R\$ 45,24	120,00	R\$ 0,38	R\$ 45,24
LOCAÇÃO CONVENCIONAL	m	100	R\$ 4,21	R\$ 5,47	R\$ 547,30	100,00	R\$ 5,47	R\$ 547,30
					R\$ 16.871,53			R\$ 18.809,61
fundacao								
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTENCIA C25, ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 12,5MM	m	122,1	R\$ 41,60	R\$ 54,08	R\$ 6.603,17		R\$ 54,08	R\$ 0,00
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTENCIA C25, ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 10,00MM	m	122,1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	122,10	R\$ 56,03	R\$ 6.841,26
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA BALDRAME EM AÇO CA-50 DE 8 MM (BALDRAME)	kg	14,48	R\$ 12,51	R\$ 16,27	R\$ 235,54	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 6,3 MM	kg	170,68	R\$ 13,72	R\$ 17,84	R\$ 3.044,31		R\$ 17,84	R\$ 0,00
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 5,0 MM	kg			R\$ 0,00	R\$ 0,00	121,92	R\$ 19,77	R\$ 2.410,28
CONCRETO FCK=25 MPA - BALDRAME	m³	6,6	R\$ 336,14	R\$ 436,98	R\$ 2.884,08	6,60	R\$ 436,98	R\$ 2.884,08
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 3)	m²	1,1	R\$ 79,03	R\$ 102,74	R\$ 113,01	1,10	R\$ 102,74	R\$ 113,01
FORMA DE MADEIRA P/ BALDRAME	m²	66	R\$ 46,52	R\$ 60,48	R\$ 3.991,42	66,00	R\$ 60,48	R\$ 3.991,42
					R\$ 34.074,52			R\$ 31.593,22
super estrutura								
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR DE AÇO CA-50 DE 12,5	kg	360,59	R\$ 9,09	R\$ 11,82	R\$ 4.261,04		R\$ 11,82	R\$ 0,00
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	kg			R\$ 0,00	R\$ 0,00	159,80	R\$ 14,23	R\$ 2.274,00
ARMADURA TRANSVERSAL PILAR CA-50 DE 6,3 MM	kg	79,772	R\$ 13,72	R\$ 17,84	R\$ 1.422,81		R\$ 17,84	R\$ 0,00
ARMADURA TRANSVERSAL PILAR CA-50 DE 5,0 MM (PILAR)	kg			R\$ 0,00	R\$ 0,00	53,85	R\$ 19,77	R\$ 1.064,54
CONCRETO FCK=25 MPA - PILAR	m³	2,85	R\$ 336,14	R\$ 436,98	R\$ 1.244,96	2,85	R\$ 436,98	R\$ 1.244,96
FORMA MADEIRA P/ PILAR	m²	48,84	R\$ 46,52	R\$ 60,48	R\$ 2.953,65	48,84	R\$ 60,48	R\$ 2.953,65
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39CM SEM VÃOS E ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	200	R\$ 62,33	R\$ 81,03	R\$ 16.205,80	200,00	R\$ 81,03	R\$ 16.205,80
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA DE RESPALDO EM AÇO CA-50 DE 8 MM (RESPALDO)	kg	14,486	R\$ 12,51	R\$ 16,26	R\$ 235,54	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 6,3 MM	kg	170,68	R\$ 13,72	R\$ 17,84	R\$ 3.044,31		R\$ 17,84	R\$ 0,00
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 5 MM	kg			R\$ 0,00	R\$ 0,00	89,83	R\$ 19,77	R\$ 1.776,01
CONCRETO FCK=25 MPA - VIGA RESPALDO	m³	6,6	R\$ 336,14	R\$ 436,98	R\$ 2.884,08	3,85	R\$ 436,98	R\$ 1.682,38
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM FCK 14 MPA COM INSTALAÇÃO	unid	282	R\$ 4,97	R\$ 6,46	R\$ 1.822,33	282,00	R\$ 6,46	R\$ 1.822,33
					R\$ 53.310,50			R\$ 52.767,27

Arq PAULO ROBERTO D'ANGARI
CAU A-14059-7

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIAIVA

Estado do Paraná

ADITIVO QUALITATIVO

fundacao					
desc	unid	quant	R\$ unit	R\$ +bdi	total
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTENCIA C25, ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 10,00MM	m	122,10		R\$ 56,03	R\$ 6.841,26
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 5,0 MM	kg	121,92		19,77	R\$ 2.410,28
super estrutura					
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	kg	159,80		R\$ 14,23	R\$ 2.274,00
ARMADURA TRANSVERSAL PILAR CA-50 DE 5,0 MM (PILAR)	kg	53,85		19,77	R\$ 1.064,54
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 5 MM	kg	89,83		19,77	R\$ 1.776,01
					R\$ 14.366,09

ADITIVO QUANTITATIVO

fundacao									
desc	unid	licitado				reprogramado			acresc
		quant	R\$ unit	R\$ +bdi	total	quant	R\$ +bdi	total	
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA BALDRAME EM AÇO CA-50 DE 8 MM (BALDRAME)	kg	14,48	12,51	16,26657	235,54	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55	R\$ 2.334,01
super estrutura									
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA DE RESPALDO EM AÇO CA-50 DE 8 MM	kg	14,48585	12,51	16,26	235,54	158,00	R\$ 16,26	R\$ 2.569,55	R\$ 2.334,01
CONCRETO FCK=25 MPA - VIGA RESPALDO	m³	6,6	336,14	436,98	2884,08	3,85	R\$ 436,98	R\$ 1.682,38	-R\$ 1.201,70
									R\$ 3.466,32

GLOSA

fundacao					
desc	unid	quant	R\$ unit	R\$ +bdi	total
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTENCIA C25, ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 12,5MM	m	122,1	41,6	54,08	6603,17
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 6,3 MM	kg	170,68	13,72	17,84	3044,31
super estrutura					
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR DE AÇO CA-50 DE 12,5	kg	360,59	9,09	11,82	4261,04
ARMADURA TRANSVERSAL PILAR CA-50 DE 6,3 MM	kg	79,772	13,72	17,83596	1422,81
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 6,3 MM	kg	170,68	13,72	17,83636	3044,31
					R\$ 18.375,64

Arq PAULO ROBERTO UNGARI
CAU/A-14059-7



www.mariaiva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

Planilha de notas 01

Nome: _____
 sobrenome: _____

Item	Indicador 01			Acumulado		
	Quest	%	Valor B	Quest	%	Valor
	3	100	1001	3	100	1001
			Total			

118
182



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

CONTRATO Nº 182/2021-PMM - PMM

LOCAL: MARIALVA

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ÁREA: 200,00 m²

Liatacos



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO 01			MED ACUMUL			
					QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	SALDO(R\$)
canteiro				R\$ 2.364,44				R\$ 2.364,44			R\$ 2.364,44			
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA)	m²	3,00	364,00	R\$ 1.092,00				3,00	100,00%	1.092,00	3,00	100,00%	1.092,00	
CONTAINER DE OBRA 4,5 M²	mes	2,00	339,95	R\$ 679,90				2,00	100,00%	679,90	2,00	100,00%	679,90	
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES	m²	120,00	0,38	R\$ 45,24				120,00	100,00%	45,24	120,00	100,00%	45,24	
LOCAÇÃO CONVENCIONAL	m	100,00	5,47	R\$ 547,30				100,00	100,00%	547,30	100,00	100,00%	547,30	
fundacao				R\$ 18.809,61				R\$ 18.809,61			R\$ 18.809,61			
ESTACA D25, INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE RESISTENCIA C25,														
ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL 10,00MM	m	122,10	56,03	R\$ 6.841,26				122,10	100,00%	6.841,26	122,10	100,00%	6.841,26	
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA BALDRAME EM AÇO CA-50 DE 8 MM (BALDRAME)	kg	158,00	16,26	R\$ 2.569,55				158,00	100,00%	2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA BALDRAME CA-50 DE 5,0 MM	kg	121,92	19,77	R\$ 2.410,28				121,92	100,00%	2.410,28	121,92	100,00%	2.410,28	
CONCRETO FCK=25 MPA - BALDRAME	m³	6,60	436,98	R\$ 2.884,08				6,60	100,00%	2.884,08	6,60	100,00%	2.884,08	
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 3)	m³	1,10	102,74	R\$ 113,01				1,10	100,00%	113,01	1,10	100,00%	113,01	
FORMA DE MADEIRA P/ BALDRAME	m²	66,00	60,48	R\$ 3.991,42				66,00	100,00%	3.991,42	66,00	100,00%	3.991,42	
super estrutura				R\$ 31.593,22				R\$ 31.593,22			R\$ 31.593,22			
ARMADURA LONGITUDINAL DE PILAR DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	kg	159,80	14,23	R\$ 2.274,00				159,80	100,00%	2.274,00	159,80	100,00%	2.274,00	
ARMADURA TRANSVERSAL PILAR CA-50 DE 5,0 MM (PILAR)	kg	53,85	19,77	R\$ 1.064,54				53,85	100,00%	1.064,54	53,85	100,00%	1.064,54	
CONCRETO FCK=25 MPA - PILAR	m³	2,85	436,98	R\$ 1.244,96				2,85	100,00%	1.244,96	2,85	100,00%	1.244,96	
FORMA MADEIRA P/ PILAR	m²	48,84	60,48	R\$ 2.953,65				48,84	100,00%	2.953,65	48,84	100,00%	2.953,65	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39CM SEM VÃOS E ARGAMASSAS DE														
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	200,00	81,03	R\$ 16.205,80				200,00	100,00%	16.205,80	200,00	100,00%	16.205,80	
ARMADURA LONGITUDINAL DE VIGA DE RESPALDO EM AÇO CA-50 DE 8 MM (RESPALDO)	kg	158,00	16,26	R\$ 2.569,55				158,00	100,00%	2.569,55	158,00	100,00%	2.569,55	
ARMADURA TRANSVERSAL VIGA DE RESPALDO CA-50 DE 5 MM	kg	89,83	19,77	R\$ 1.776,01				89,83	100,00%	1.776,01	89,83	100,00%	1.776,01	
CONCRETO FCK=25 MPA - VIGA RESPALDO	m³	3,85	436,98	R\$ 1.682,38				3,85	100,00%	1.682,38	3,85	100,00%	1.682,38	
CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM FCK 14 MPA COM INSTALAÇÃO	unid	282,00	6,46	R\$ 1.822,33				282,00	100,00%	1.822,33	282,00	100,00%	1.822,33	
TOTAL				R\$ 52.767,27				R\$ 52.767,27			R\$ 52.767,27			

CUSTO TOTAL EM R\$ 52.767,27
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO EM R\$ 52.767,27
% DA MEDIÇÃO 100,00%
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 52.767,27
% DA MEDIÇÃO ACUMULADA EM R\$ 100,00%
DATA DA MEDIÇÃO: 12/08/2021

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 25228/O

GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ

DOCiou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 367796
CNPJ 09.306.197/0001-66
Nome favorecido DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUCAO CIVI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.903
Valor 49.152,71
Destinação 0
Data transferência 19/08/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8586F01243629982

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	19/08/2021 14:18:22
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	19/08/2021 16:26:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

5,276,727 +

001

5,276,727 - 00 *

52,767 - 27 +

ISS - 2,031 - 54 -

ISS - 1,583 - 02 -

-001

49,152 - 71 *
